ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**Rasmussen College**	**233 d**	**1/4/10**	**12/1/10**
2	**Site**	**73 d**	**1/4/10**	**4/14/10**
3	Preliminary Sitework	25 d	1/4/10	2/5/10
4	Sewer/Water/Elec to Bldg.	5 d	2/8/10	2/12/10
5	Utilities Inspection	2 d	2/15/10	2/16/10
6	Irrigation Chases	1 d	2/17/10	2/17/10
7	Stabilize & Limerock	10 d	2/18/10	3/3/10
8	Paving	7 d	3/4/10	3/12/10
9	Sidewalks & Curbs	6 d	3/15/10	3/22/10
10	Irrigation & Landscaping	6 d	3/23/10	3/30/10
11	Misc. Site Items	4 d	3/31/10	4/5/10
12	Survey & Engineering Insp.	4 d	4/6/10	4/9/10
13	Final Site Inspection	3 d	4/12/10	4/14/10
14	**Building Shell**	**98 d**	**4/15/10**	**9/1/10**
15	Building Permit	1 d	4/15/10	4/15/10
16	Layout	3 d	4/16/10	4/20/10
17	Prep Foundations	5 d	4/21/10	4/27/10
18	Foundation Inspection	1 d	4/28/10	4/28/10
19	Pour Foundation	3 d	4/29/10	5/3/10
20	Stem wall	3 d	5/4/10	5/6/10
21	Stem Wall Inspection	1 d	5/7/10	5/7/10
22	Pour Stem Wall	2 d	5/10/10	5/11/10
23	MEP Slab Rough-in	9 d	5/12/10	5/24/10
24	MEP Slab Inspection	2 d	5/25/10	5/26/10
25	Prep Slab	1 d	5/27/10	5/27/10
26	Slab Inspection	1 d	5/28/10	5/28/10
27	Pour Slab	3 d	6/1/10	6/3/10
28	CMU Walls	10 d	6/4/10	6/17/10
29	Wall Inspection	1 d	6/18/10	6/18/10
30	Inbed Layout	1 d	6/21/10	6/21/10
31	Pour Beams/Straps	1 d	6/22/10	6/22/10
32	Structural Steel	5 d	6/23/10	6/29/10
33	Bar Joists/Decking	9 d	6/30/10	7/13/10
34	Roofing	8 d	7/14/10	7/23/10
35	Roofing Inspection	1 d	7/26/10	7/26/10
36	Frame Soffit & Sub-fascia	3 d	7/27/10	7/29/10
37	Windows & Doors	8 d	7/30/10	8/10/10
38	Ornamental Masonry	10 d	8/11/10	8/24/10
39	Soffit & Fascia	4 d	8/25/10	8/30/10
40	Gutters & Downspouts	2 d	8/31/10	9/1/10
41	**Interior Build-out**	**89 d**	**7/27/10**	**12/1/10**
42	Interior Wall Framing	12 d	7/27/10	8/11/10
43	MEP Wall Rough-in	10 d	8/12/10	8/25/10
44	MEP Rough Inspection	2 d	8/26/10	8/27/10
45	Insulation	3 d	8/30/10	9/1/10
46	Insulation Inspection	1 d	9/2/10	9/2/10
47	Drywall	10 d	9/3/10	9/17/10
48	Paint (Prime & 1 coat)	8 d	9/20/10	9/29/10
49	Ceiling Grid	4 d	9/30/10	10/5/10
50	MEP Above Ceiling	5 d	10/6/10	10/12/10
51	MEP & Grid Inspection	1 d	10/13/10	10/13/10
52	Drop Ceiling Tiles	4 d	10/14/10	10/19/10
53	Door Frames	4 d	10/20/10	10/25/10
54	Flooring (Wet Areas)	3 d	10/26/10	10/28/10
55	Plumbing Fixtures	4 d	10/29/10	11/3/10
56	Paint/Stain Doors & Frames	7 d	10/29/10	11/8/10
57	Cabinets	8 d	10/29/10	11/9/10
58	Elect & AC Trim	5 d	10/29/10	11/4/10
59	Semi-Perm Inspection	1 d	11/5/10	11/5/10
60	Semi-Perm Power	4 d	11/8/10	11/11/10
61	Equipment Start-up	3 d	11/12/10	11/16/10
62	Flooring (Bal. of project)	4 d	11/10/10	11/15/10
63	Specialties	4 d	11/16/10	11/19/10
64	Final Cleaning	4 d	11/22/10	11/29/10
65	Final MEP Inspection	4 d	11/22/10	11/29/10
66	Fire Marshall Inspection	1 d	11/30/10	11/30/10
67	Final Bldg. Inspection	1 d	11/30/10	11/30/10
68	Bldg C.O.	1 d	12/1/10	12/1/10

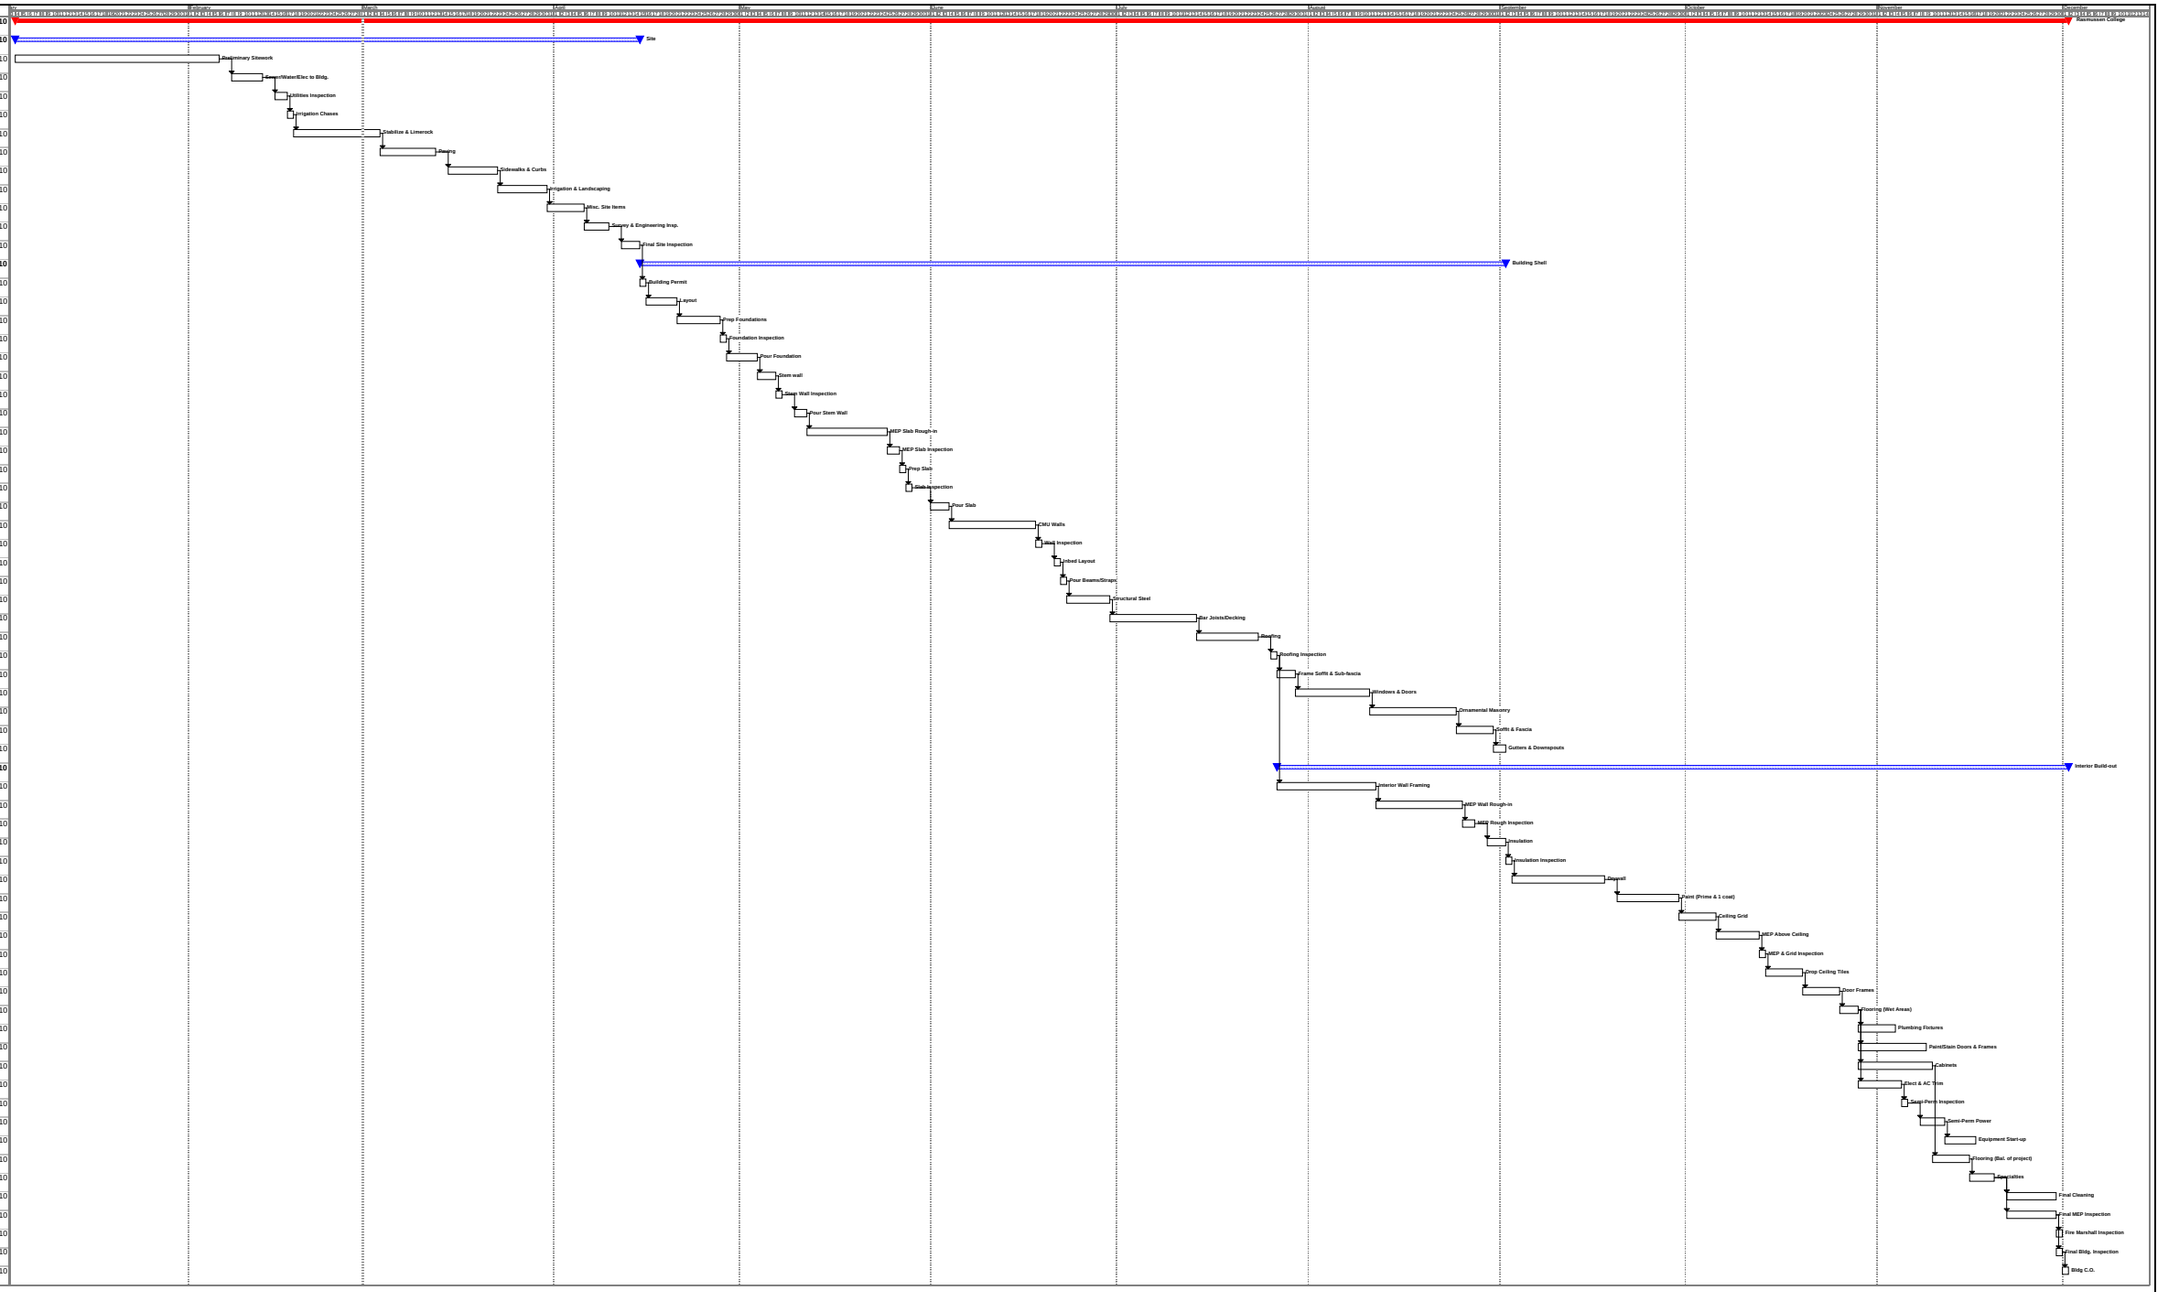

Rasmussen College - SR 200, Ocala FL
Scheduled Start Date: 1/4/10
Scheduled Finished Date: 12/1/10

Brian Ehlers Construction Co., Inc.
Printed Date: 3/1/10
